Project_Plan_v0.1



<u>Ονοματεπώνυμο</u>	<u>e-mail</u>	AM
Αντωνίου Σωτήρης	st1067512@ceid.upatras.gr	1067512
Βακάσης Άγγελος	st1070724@ceid.upatras.gr	1070724
Ζύμνης Μάρκελλος	st1059562@ceid.upatras.gr	1059562
Παπαζαχαρία Εμμανουέλα	st1064044@ceid.upatras.gr	1064044

Editor: Παπαζαχαρία Εμμανουέλα, ΑΜ : 1064044
Contributor: Ζύμνης Μάρκελλος , ΑΜ : 1059562
Peer Reviewer: Αντωνίου Σωτήρης, ΑΜ : 1067512 , Βακάσης Άγγελος, ΑΜ : 1070724


Περιεχόμενα

1. Διάγραμμα Gantt	4
2. Διάγραμμα Pert	5
3. Προγραμματισμός Εργασίας	6
4. Εκτίμηση κόστους	8
5. Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν	9


1. Διάγραμμα Gantt

Για το παρακάτω Gantt chart θεωρούμε πως η ομάδα υλοποίησης του συστήματος εργάστηκε από την 6η Μαρτίου μέχρι και την 1η Μαρτίου του επόμενου έτους με μια κανονική εκτίμηση εργασίας. Υποθέτουμε πως εργαζόμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή χωρίς να λαμβάνουμε υπόψιν μας αργίες.



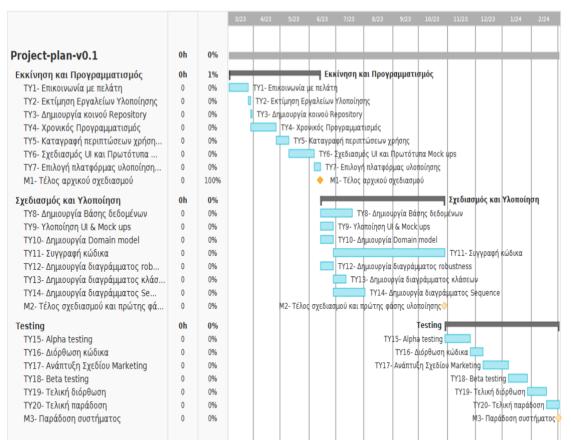

2. Διάγραμμα Pert

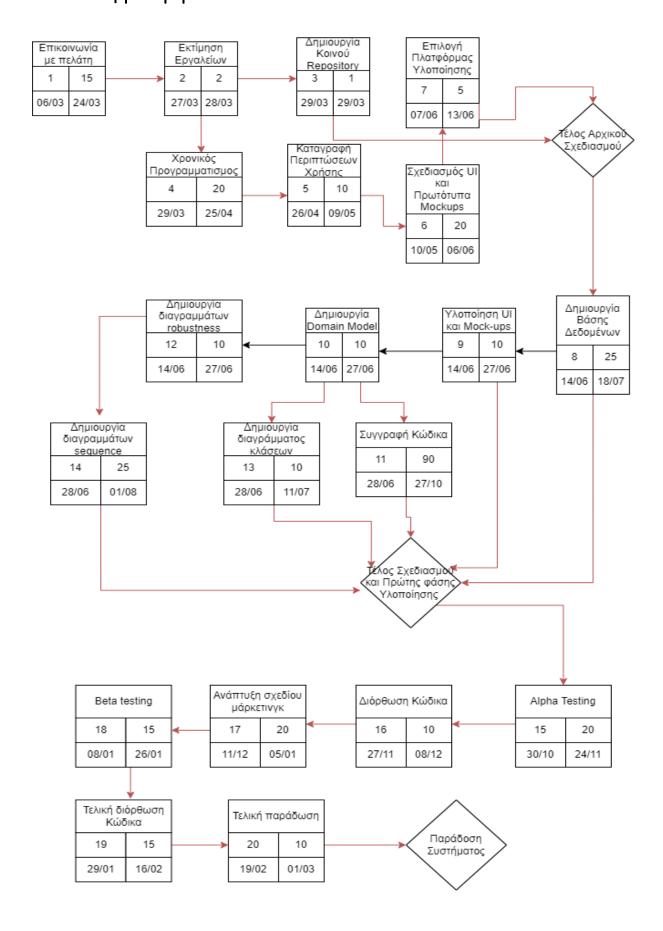

3. Προγραμματισμός Εργασίας

Σύμφωνα με την ανάπτυξη και ανάλυση της ιδέας χωρίσαμε το έργο σε είκοσι (20) τυπικά υποέργα (ΤΥ). Κατα την ανάλυση των διεργασιών που πρέπει να γίνουν σε κάθε τυπικό υποέργο είναι προαπαιτούμενο να έχουν διεκπεραίωθει-ολοκληρωθεί κάποια από τα προηγούμενα διότι περιέχουν κρίσιμη πληροφορία για την ροή ανάπτυξης του συστήματος. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ΤΥ και οι εξαρτήσεις τους από προηγούμενα αλλά και μια εκτίμηση για το πόσες μέρες χρειάζεται κάθε τυπικό υποέργο για την ολοκλήρωση του.

ΤΥΠΙΚΟ ΥΠΟΕΡΓΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥ	<u>ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ</u>
TY1	Επικοινωνία με πελάτη	-	15
TY2	Εκτίμηση εργαλείων	TY1	2
TY3	Δημιουργία κοινού Repository	TY2	1
TY4	Χρονικός Προγραμματισμος	TY2	20
TY5	Καταγραφή περιπτώσεων χρήσης	TY4	10
TY6	Σχεδιασμός UI και Πρωτότυπα Mock-ups	TY5	20
TY7	Επιλογή πλατφόρμας υλοποίησης	TY6	5
TY8	Δημιουργία βάσης δεδομένων	TY5,TY7	25
TY9	Υλοποίηση UI και Mock-ups	TY6	10
TY10	Δημιουργία domain model	TY5	10
TY11	Συγγραφή κώδικα	TY10	90
TY12	Δημιουργία διαγραμμάτων robustness	TY5	10
TY13	Δημιουργία διαγράμματος	TY10	10

	κλάσεων		
TY14	Δημιουργία διαγραμμάτων sequence	TY12	25
TY15	Alpha testing	TY11	20
TY16	Διόρθωση κώδικα	TY15	10
TY17	Ανάπτυξη σχεδίου μάρκετινγκ	TY16	20
TY18	Beta testing	TY17	15
TY19	Τελική διόρθωση	TY18	15
TY20	Τελική παράδοση	TY19	10

4. Εκτίμηση κόστους

Για την εκτίμηση του κόστους είναι αναγκαίο να αναφέρουμε τις παραδοχές που κάναμε. Θεωρούμε ότι τα μέλη της ομάδας λειτουργούν ως εργαζόμενοι, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Όλα τα μέλη της ομάδας απασχολούνται τις ίδιες ώρες και θεωρούμε πως τα Σαββατοκύριακα δεν εργάζονται, ωστόσο δεν λαμβάνονται υπόψη οι αργίες. Ο φόρτος εργασίας έχει μοιραστεί ισόποσα. Κατατάσσουμε στα έμμεσα κόστη τα έξοδα στέγασης, την αμοιβή του δικηγόρου και του λογιστή, καθώς και το ποσό που υπολογίζεται να δαπανηθεί για την αγορά και συντήρηση του απαραίτητου εξοπλισμού για κάθε ένα μέλος της ομάδας. Αναλυτικά, για την ενοικίαση χώρου με μία μέση τιμή ενοικίου 450Ε/μήνα, υπολογίζοντας πως η ολοκλήρωση του έργου θα χρειαστεί 12 μήνες, το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 5,400Ε.

- Για την αμοιβή ενός λογιστή κοστολογώντας την εργασία του στα 50Ε/μήνα, υπολογίζοντας πως η ολοκλήρωση του έργου θα χρειαστεί περίπου 12 μήνες, το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 600Ε.
- Για την αμοιβή ενός δικηγόρου κοστολογώντας την εργασία του στα 100Ε/μήνα, υπολογίζοντας πως η ολοκλήρωση του έργου θα χρειαστεί περίπου 12 μήνες, το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 1200Ε.
- Για την αγορά και συντήρηση του εξοπλισμού κάθε ενός μέλους της ομάδας υπολογίζεται να χρειαστούν περίπου 4,800Ε, πιο αναλυτικά 1,200Ε/μέλος. Επομένως, η εκτίμηση κόστους του έργου ανέρχεται στα 12,000Ε.

5. Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

- Για τη συγγραφή τεχνικών κειμένων χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Google Docs.
- Για τη δημιουργία των διαγραμμάτων Gantt και Pert. χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία Team Gantt και Draw.io.
- Για τη δημιουργία του λογότυπου χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο logoai.com.
